

Druckprüfung DIN EN1610

Auftraggeber :
:
:
Straße :
Ort :
Telefon :
Fax :

ENTWURF

Auftragnehmer : RheinRuhrSan GmbH
:
:
Straße : Karl-Friedrich-Friesen-Str. 36
Ort : 44625 Herne
Telefon : 023239192844
Fax : 023239192845

Prüfdatum : 17.02.2010 Auftrag :
Anwesende : Hagemeister
Kommentar : Vor dem öffnen des Zulaufes

Auftragsdatum :

Bezeichnung : 01
: STR01
: Stadtkanal
Ort : Kamp-Lintfort
Straße :
Entwässerungssystem : **ENTWURF**

Leitungsnetzdaten s. 2. Seite

Prüfmaterial : GFK
Prüfdruck : 233,1 mbar
Prüfzeit : 94 s


Prüfverfahren : DIN LD
Beruhigungszeit : 174 s
Vorfülldruck : 220 mbar

Bauteil (Nr.) : 1
Bauteil : STR01-SK

Anfangsdruck : 233,1 mbar
Enddruck : 231,4 mbar

Druckprüfung nach DIN EN 1610 bestanden.

Prüfer : Unterschrift :

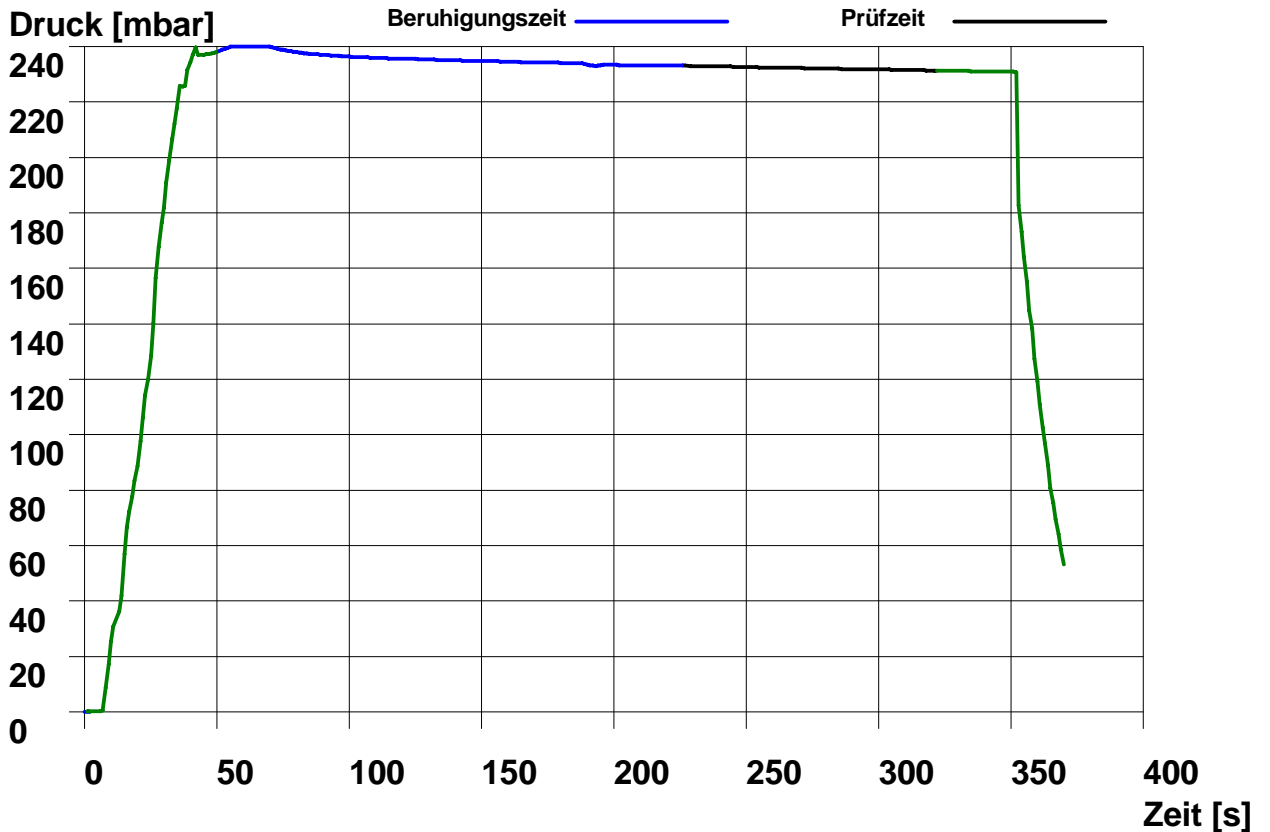

Ort
Straße

Leitungsnetz : 01

: STR01

: Stadtkanal

ENTWURF

Durchmesser : 100 mm

Länge : 2.00 m

Durchmesser : 150 mm

Länge : 8.00 m
